

名城庭球場クラブハウス新築工事 (工事期間：令和5年11月1日～令和7年3月31日(予定))

① 2023.11.16 (木) 外周部ネットフェンス撤去、仮囲い設置→段差部擁壁解体中、電柱撤去工事中



② 2023.12.26 (火) 工事用仮設ハウス設置、杭打ち完了、コンボ搬入、根伐り開始



③ 2024.1.23 (火) 根伐り完了、法面ブルーシート養生、砕石敷込み、捨てコン打設、基礎鉄筋用足場組



④a 2024.1.27 (土) 基礎柱・地中梁 鉄筋配筋



④b 2024.2.8 (木) 連絡通路 基礎工事
：フーチング&柱脚配筋、アンカーボルトセット



⑤a 基礎コンクリート打設完了、埋戻し開始



根伐り土 仮置き状況



⑤b 2024.2.28 (水)
連絡通路 基礎コンクリート打設完了



⑥b 2024.3.2 (土) 連絡通路 埋戻し



⑥a 2024.3.2 (土) 埋戻し



⑦a 2024.3.14 (木) 本体地上鉄骨建て方



⑦b 2024.3.19 (火) 連絡通路 柱脚鉄骨設置



⑧a 2024.3.19 (火) 本体鉄骨建て方、外部足場架構



⑧b 2024.3.22 (金) 連絡通路デッキプレート敷き



⑨ 2024.3.22 (金) 全景
連絡通路～本体



⑩ 2024.3.27(水)連絡通路 床・立上り配筋 →

⑪2024.3.30 (土) 連絡通路 床：コンクリート打設



⑫2024.4.10 (水) 連絡通路 立上り：型枠設置





⑬2024.7.17 (水)

スロープ基礎・立上がり：配筋



⑭2024.8.6 (火)

スロープ基礎：コンクリート打設

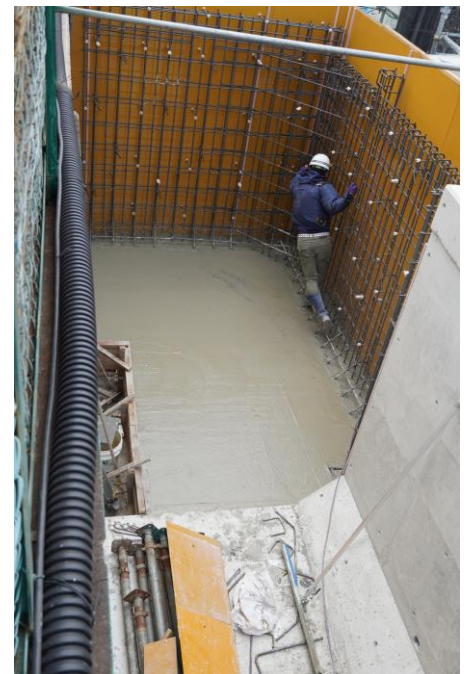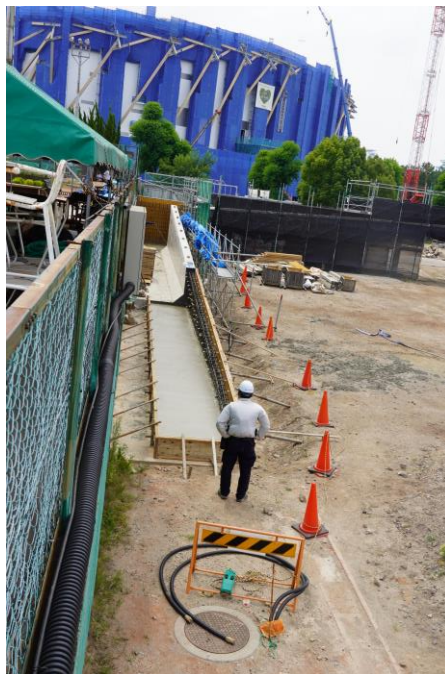

⑮ 2024.8.22 (木)

連絡通路：コンクリート打設



⑯2024.8.22 (木)

クラブハウス：外部足場解体



⑩2024.9.6（金）本体建屋—連絡通路—スロープ 接続、 スロープ部：埋め戻し
外壁：押出成型セメント版の上フラットパネル横貼り



⑪2024.9.21（土）連絡通路&スロープ：床配筋



⑩b 2024.10.25（金）鉄骨階段設置
連絡通路床：人工木デッキ敷き込み
アルミ手摺設置、照明用ポール設置

⑩a2024.10.25（金）排水溝、ネットフェンス基礎 設置



①9a 2024.12.28 (土) ネットフェンス設置



①9b 2024.12.28 (土) ネットフェンス設置



掲載期限：2025年4月末
